


Id		Task Name	% concluída	Início	Término	2
1		PLANEJAMENTO PLURIANUAL DOS PROJETOS DECORRENTES DO PDTI	55%	Ter 21/05/13	Qui 29/12/16	
2		Implantação do backup externo com contingência plena.	100%	Seg 03/06/13	Sex 28/03/14	
3		Definição e implantação do site de backup externo, bem como definição e formalização rotinas de backup "on site"	100%	Seg 03/06/13	Sex 28/03/14	
4		Absorção completa (operação e gestão) do sistema de saúde pela FRG.	100%	Seg 01/07/13	Qui 30/01/14	
5		Migração do Benner (operação conjunta seguida de handover)	100%	Seg 02/09/13	Qui 30/01/14	
6		Formação de equipe própria da FRG (GTI e GSA)	100%	Seg 01/07/13	Sex 30/08/13	
7		Criação dos processos horizontais de gestão de TI (domínios de Planejamento e organização e Monitoração e avaliação do Cobit)	47%	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	
8		Implantar software de monitoração proativa de infraestrutura, incluindo metodologia e software de apoio à gestão e ao controle de produção	60%	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	
9		Implantar software de gestão de ciclo de vida de sistemas aplicativos	0%	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	
10		Consolidar a gestão de contratos e recursos de TI na GTI	80%	Ter 21/05/13	Sex 31/01/14	
11		Aumentar a interação via web com participantes, funcionários e parceiros de negócio via web	67%	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	
12		Criação e implantação técnica de infraestrutura de segurança de acesso compatível com uma interação "extranet" mais ampla	100%	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	
13		Desenvolvimento da nova versão do portal de RH	0%	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	
14		Desenvolvimento da nova versão do portal de FRG	100%	Seg 02/06/14	Sex 27/02/15	
15		Automação completa da integração entre os sistemas aplicativos	43%	Sex 02/01/15	Ter 29/12/15	
16		Implantação de um software de automação de interfaces	0%	Seg 02/03/15	Ter 29/12/15	
17		Incorporação de módulos nos sistemas principais (prev. e saúde)	80%	Sex 02/01/15	Ter 29/12/15	
18		Extensão funcional das aplicações	45%	Seg 02/06/14	Ter 29/09/15	
19		Implantação de novas funcionalidades nos sistemas aplicativos, via aquisição de novos módulos de aplicativos já contratados	45%	Seg 02/06/14	Ter 29/09/15	
20		Atualizar softwares aplicativos e de infraestrutura	100%	Ter 01/10/13	Ter 15/04/14	

Project: PMO Date: Sex 06/11/15	Task		Marco Inativo		Somente término	
	Split		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Milestone		Tarefa Manual		Marco externo	
	Summary		Somente duração		Progress	
	Project Summary		Acúmulo de Resumo Manual		Deadline	
	External Tasks		Resumo Manual			
	External Milestone		Somente início			

Id		Task Name	% concluída	Início	Término	2
21		Encadeamento orçamentário e técnico das atualizações	100%	Ter 01/10/13	Ter 15/04/14	
22		Implantar aplicações não-transacionais de suporte à decisão, controles internos e de informação executiva.	0%	Sex 02/01/15	Qua 30/09/15	
23		Implantar solução para modelagem, EIS e boletagem (via GED) na DI. E implantação de EIS em suporte à SEC	0%	Sex 02/01/15	Qua 30/09/15	
24		Implantar a gestão eletrônica de documentos (GED) de forma abrangente (verticalmente e horizontalmente)	33%	Seg 04/01/16	Qui 29/12/16	
25		Incorporação do legado	100%	Seg 04/01/16	Qui 29/12/16	
26		Implantação de workflow abrangente, multidepartamental e multifuncional	0%	Seg 04/01/16	Qui 29/12/16	
27		Implantação das funções de assinatura digital e digitalizada	0%	Seg 01/08/16	Qui 29/12/16	
28		Implantação das funções de gestão de conhecimento (especialmente para SEC, GAS, GTI)	0%	Qua 01/06/16	Qui 29/12/16	
29		Aperfeiçoar o sistema de suporte ao atendimento (presencial ou por e-mail, telefone/fax) de participantes	100%	Seg 01/06/15	Sex 27/11/15	
30		Extensão funcional do Orbium (incluindo a automação de funções de recepção e envio de e-mails)	100%	Seg 01/06/15	Sex 27/11/15	
31		Implantar segurança de informação de forma integrada e corporativa	80%	Seg 03/08/15	Sex 26/02/16	
32		Implantar a segurança de informação de maneira abrangente (informações, programas, rotinas e sistemas - com foco nas funções de acesso, armazenamento e recuperação).	80%	Seg 03/08/15	Sex 26/02/16	

Project: PMO Date: Sex 06/11/15	Task		Marco Inativo		Somente término	
	Split		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Milestone		Tarefa Manual		Marco externo	
	Summary		Somente duração		Progress	
	Project Summary		Acúmulo de Resumo Manual		Deadline	
	External Tasks		Resumo Manual			
	External Milestone		Somente início			

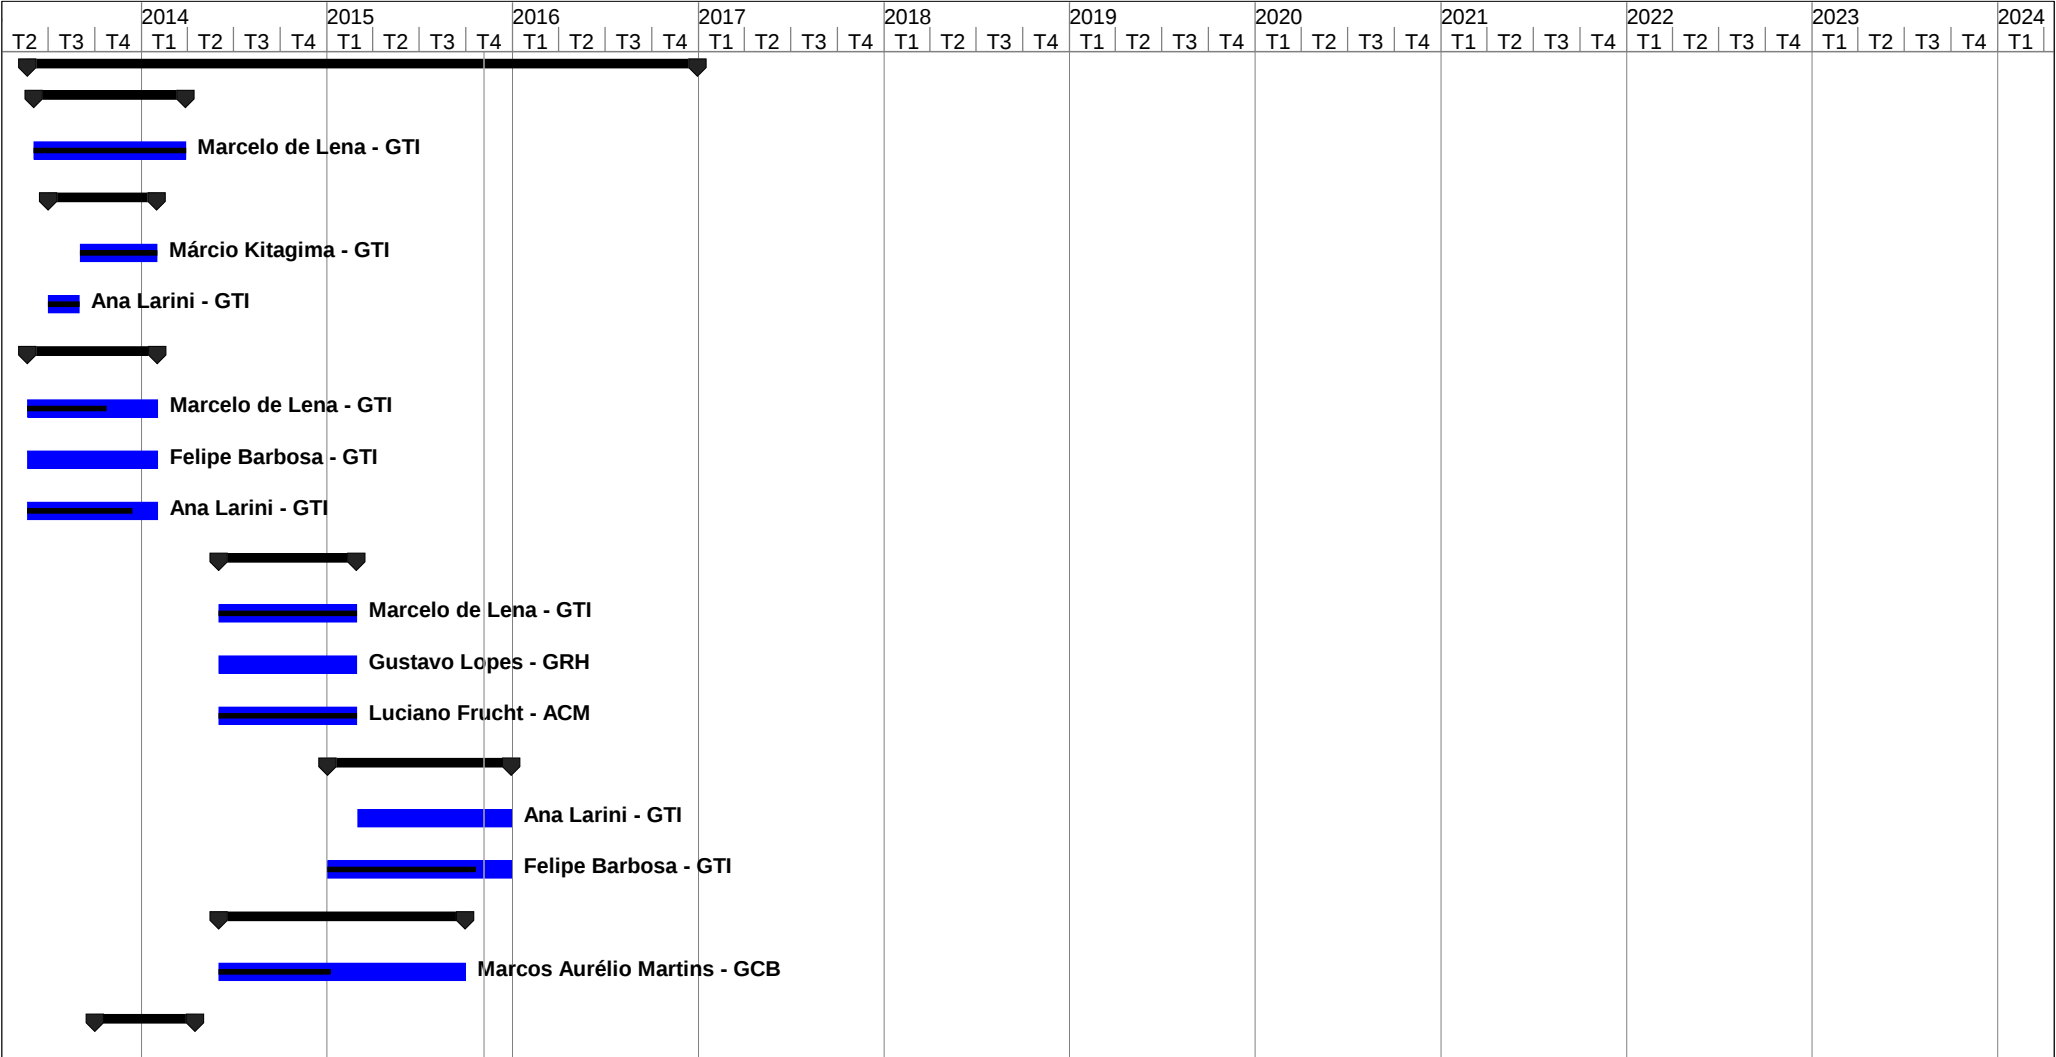

Project: PMO Date: Sex 06/11/15	Task		Marco Inativo		Somente término	
	Split		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Milestone		Tarefa Manual		Marco externo	
	Summary		Somente duração		Progress	
	Project Summary		Acúmulo de Resumo Manual		Deadline	
	External Tasks		Resumo Manual			
	External Milestone		Somente início			

